

HES 1000283166

Abancay, 26 de abril de 2023.

Inf. N° RAP-048-2023.

Para : Gerente Regional Apurimac Electro Sur Este S.A.A.

Asunto : Valorizacion de Supervision de Obra N° 07.

Referencia del servicio : SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR DE CHUQUIBAMBILLA, EN LOS SECTORES DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC"

Adjunto se remite el informe, la documentación correspondiente y la justificación otorgando la conformidad del Servicio realizado, cuyos datos son:

DATOS GENERALES DEL SERVICIO.

Objeto del Proceso : Servicio de Supervisión de Obra
Nombre de la Obra a supervisar : SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR DE CHUQUIBAMBILLA, EN LOS SECTORES DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC"

PC : 4500063089
Requerimiento del servicio : Solicitado por el Área de Proyectos y Obras

DATOS DEL CONTRATO DEL SERVICIO

Supervisor : JESÚS OROSCO LEGUIA
Proceso :
N° de la Orden de Servicio : 4500063089
Firma de Orden de Servicio : 11/10/2022
Monto de la Orden de Servicio : S/. 36,740.00
Inicio del Servicio de Supervisión : 13/10/2022
Plazo de ejecución previsto : 180 días calendarios
Conclusion : 10/04/2023

RESUMEN DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA.

Fecha de solicitud : 26/04/2023
Periodo : Abril 2023
Avance Físico del Mes : 8.30%
Avance Físico Acumulado : 71.29%
Honorario Profesional N° : E001 - 00000129 Del 26/04/2023

	NOMBRE DEL SERVICIO.	MONTO (S/.)
B: Valorizacion según Contrato	: Servicio de Supervisión de Obra	S/. 1,973.40
	: IGV	S/. 0.00
	: Total Valorizado a pagar (incluye IGV)	S/. 1,973.40

CONCLUSIONES

Mediante el presente, esta administración otorga CONFORMIDAD PARCIAL, por la SUPERVISIÓN DE LA OBRA: "RENOVACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR DE CHUQUIBAMBILLA, EN LOS SECTORES DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO DE APURÍMAC", financiado por ELSE. El mismo que tiene un avance del 71.29 %, por lo que se solicita autorizar el pago correspondiente al periodo Abril 2023, el mismo que asciende a la suma de S/ 1973.4, incluido los impuestos de ley.

Atentamente.



Firmado
digitalmente por
OLIVERA UMERES
Alfredo FAU
20116544289 soft
Fecha: 2023.04.26
15:59:30 -05'00'

OROSCO LEGUIA JESUS

R.U.C. 10437584091

INGENIERO

PJ. LAS PALMAS MZA. E LOTE. 1 APV. EL PORVENIR CUSCO - CUSCO - SANTIAGO

TELÉFONO: -

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 129

Recibí de: ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Identificado con RUC **número** 20116544289

Domiciliado en AV. SUCRE NRO. 400 URB. BANCOPATA CUSCO - CUSCO - SANTIAGO

La suma UN MIL OCHOCIENTOS QUINCE Y 53/100 SOLES

Por concepto de SUPERVISION DE LA OBRA : RENOVACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA, EN EL (LA) ALIMENTADOR DE CHUQUIBAMBILLA, EN LOS SECTORES DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC.

Observación ABRIL 2023

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 26 **de** Abril **del** 2023

Total por honorarios: 1,973.40

Retención (8 %) IR: (157.87)

Total Neto Recibido: 1,815.53 SOLES



Firmado
digitalmente por
OLIVERA UMERES
Alfredo FAU
20116544289 soft
Fecha: 2023.04.26
16:09:04 -05'00'


 Ing. Jesus Orosco Leguia
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 155249



Jesús Orosco Leguía
Ingeniero Electricista
CIP:155249
Telf. Cel.: 943420086

CARTA N° 020-2023/SUP-ELSE-A/JOL.

PARA : ING. ALFREDO OLIVERA UMERES
JEFE DE OBRAS - ELECTRO SUR ESTE S.A.A. APURIMAC

DE : ING. JESUS OROSCO LEGUIA
SUPERVISOR DE OBRA

ASUNTO : REMITE VALORIZACION N° 07 DE SUPERVISION - CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023

REFERENCIA : 1. OBRA: RENOVACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA, EN EL (LA) ALIMENTADOR DE CHUQUIBAMBILLA, EN LOS SECTORES DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC.
2. PEDIDO COMPRA N°4500063089

FECHA : 26 DE ABRIL DEL 2023

De mi mayor consideración:

Mediante la presente me dirijo a usted, para expresarles un cordial saludo y a la vez remitir la **VALORIZACION 07 DE SUPERVISION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023**, de la Supervisión de OBRA: “RENOVACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA, EN EL (LA) ALIMENTADOR DE CHUQUIBAMBILLA, EN LOS SECTORES DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC”.

Para lo cual se adjunta.

- Recibo por Honorarios
- Cuenta CCI.
- Valorización de Supervisión.
- Informe de Supervisión.

Sin otro particular por el momento me suscribo de usted.



Ing. Jesús Orosco Leguía
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 155249

Razón Social: EMP.REG. DE SERV. PÚBL. DE ELEC. DEL SUR ESTE
SAA**RUC:** 20116544289**Dirección:** Av. Mariscal Sucre 400**Proveedor:** 1000016604 OROSCO LEGUIA JESUS**Dirección:** AV.VENEZUELA S/N**RUC:** 10437584091**Teléfono:****Cond. de pago:** F013 Pago a 13 días**Tipo de cambio:** *1.00000

Tipo de Cambio: -1.00000									
Pos	Nro Solped	Tipo	Material	Descripción	Plazo	UM	Cantidad	Precio Unit	Total
	Nro Necesidad		Cod. Parte		Ent.	Lugar de entrega			
10	10076256	S		SUPERVISION DE OBRA DE R	0	US	1	36,740.00	36,740.00
				P Y RS	E502 Apurímac				
								Sub Total	36,740.00
								Tot Costos Ind.	0.00
								IGV	0.00
								Total	36,740.00

Son: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100 Soles**INFORMACION ADICIONAL**

SUPERVISIÓN DE LA OBRA: RENOVACIÓN DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN EL ALIMENTADOR DE CHUQUIBAMBILLA. EN LOS SECTORES DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO APURÍMAC. SEGUN AUTORIZACION DE ADQUISICION SERVICIO SIELSE NRO. 100202200093 SOLPED 10076256

CONDICIONES

- > El plazo de entrega se computará a partir del día siguiente de notificado el pedido de compra.
- > En caso de no cumplir con los plazos de entrega establecidos, se aplicarán las penalidades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado o en las Disposiciones Internas de la Entidad.
- > Adjuntar la guía de remisión en el caso de contratación de bienes.
- > Indicar el número de cuenta corriente y/o Ahorros, entidad financiera, número de cuenta de Detracción para el depósito de su pago.
- > Al momento de presentar el comprobante de pago, deberá indicar el N° de cuenta bancaria en la cual se depositará el pago correspondiente. Indicar en el comprobante de pago el N° de Pedido de Compra y además si está afecto a la retención y/o detracción del IGV. Presentar el comprobante de pago con dos copias del mismo y copia del presente Pedido de Compra.



Elaborado por
Simón Tadeo Mayhuire
Vega



Julio César Nina
Hanco
Jef Logística Apurim
11.10.2022
17:43:58



Armando Alarcón
Espinoza
Ger Adm Finan Apurim
11.10.2022
17:44:23

JESUS OROSCO LEGUIA

RUC: 10437584091

1. CUENTA DE AHORROS BANCO DE CREDITO DEL PERU (BCP).



- CUENTA DE AHORRO EN SOLES S/. : 28520356722011

CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIO CCI: 00228512035672201155



Ing. Jesus Orosco Leguia
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 155249

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains a small emblem of a triangle inside a circle. To the right of the stamp, the text 'Ing. Jesus Orosco Leguia' is printed, followed by 'SUPERVISOR DE OBRA' and 'CIP: 155249' on separate lines. A long vertical line is drawn through the signature and the stamp.



Jesús Orosco Leguía
Ingeniero Electricista
CIP:155249
Telf. Cel.: 943420086

VALORIZACION DE SUPERVISION

VALORIZACIÓN N° 07 - ABRIL 2023

SUPERVISIÓN DE LA OBRA:	RENOVACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA, EN EL (LA) ALIMENTADOR DE CHUQUIBAMBILLA, EN LOS SECTORES DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC
-------------------------	---

SOLICITUD DE PAGO DE VALORIZACIONES

1 UNIDAD EJECUTORA	: ELECTRO SUR ESTE S.A.A.
2 SUPERVISION DE LA OBRA	: RENOVACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA, EN EL (LA) ALIMENTADOR DE CHUQUIBAMBILLA, EN LOS SECTORES DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC
3 ORDEN DE COMPRA N°	: 4500063089
4 SUPERVISION	: ING. JESUS OROSCO LEGUIA
5 VALORIZACIÓN N°	: 07
6 MES Y AÑO	: ABRIL 2023
7 ENTIDAD PAGADORA	: ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

Montro Bruto Valorizado (A)

- Valorización Mensual	:	S/, 1,973.40	
- Reajuste	:	S/, 0.00	
- Deducciones y otros	:	S/, 0.00	
Valorización Bruta	:		1,973.40

Amortización del Adelanto (B)

- Directo	:	S/,	
- Materiales	:	S/,	
Total Amortizaciones	:		0.00

Valorización Neta = (A) - (B)	:	S/, 1,973.40	
I.G.V. (18% VN)	:	S/, 0.00	

TOTAL A GIRAR	1,973.40
----------------------	-----------------

Aplicar Retención por Fondo de Garantía	:	S/,	
Primera Retencion Fondo Garantía	:		0.00

TOTAL A COBRAR NETO	S/,	1,973.40
----------------------------	-----	-----------------



Ing. Jesus Orosco Leguia
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP: 155249



Firmado digitalmente por OLIVERA UMERES
 Alfredo FAU
 20116544289 soft
 Fecha: 2023.04.26 16:09:23 -05'00'

ING. JESUS OROSCO LEGUIA
 SUPERVISOR DE OBRA

APROBADO POR
 Electro Sur Este S.A.A.

VALORIZACIÓN N° 07 - ABRIL 2023
PRESUPUESTO PRINCIPAL
ABRIL 2023
SECCION : RESUMEN GENERAL


OBRA : RENOVACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA, EN EL (LA) ALIMENTADOR DE CHUQUIBAMBILLA, EN LOS SECTORES DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC

ORDEN DE COMPRA N° : 4500063089

SUPERVISOR DE LA OBRA : ING. JESUS OROSCO LEGUIA

MONTO DE CONTRATO S/ : 36,792.00

CONCEPTO	SOLES
Monto Valorizado en el Presente Mes	1,973.40
VALORIZACION N° 01	1,973.40
Monto Por Reajuste	0.00
Amortizacion de Adelanto en Efectivo	0.00
Amortizacion de Adelanto en Efectivo N° 01	0.00
Amortizacion de Adelanto de Materiales	0.00
Amortizacion de Adelanto de Materiales N° 01	0.00
Deduccion del Reajuste que no corresponde	0.00
Deduccion del Reajuste - Amort. Adel. Efectivo	0.00
Deduccion del Reajuste - Amort. Adel. Materiales	0.00
Otros	0.00
I. MONTO FACTURABLE (Sin IGV)	1,973.40
Monto Retenido por Fondo de Garantía	0.00
II. TOTAL DE RETENCION	0.00
III. MONTO LIQUIDO A APAGAR	1,973.40
IV. I.G.V. (18% DE I)	0.00
V. MONTO A FACTURAR (I + IV)	1,973.40



Firmado
digitalmente por
OLIVERA UMERES
Alfredo FAU
20116544289 soft
Fecha: 2023.04.26
16:09:44 -05'00'



Ing. Jesus Orosco Leguia
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 155249

RESUMEN PAGOS A CUENTA
PRESUPUESTO PRINCIPAL
ABRIL 2023

PROYECTO : RENOVACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA, EN EL (LA) ALIMENTADOR DE CHUQUIBAMBILLA, EN LOS SECTORES DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC

CONTRATISTA : **ING. JESUS OROSCO LEGUIA**

ORDEN DE COMPRA : 4500063089

MONTO TOTAL 36,792.00

CONCEPTO	oct-2022 Val. N° 01	nov-2022 Val. N° 02	dic-2022 Val. N° 03	ene-2023 Val. N° 04	feb-2023 Val. N° 05	mar-2023 Val. N° 06	abr-2022 Val. N° 07	may-2022 Val. N° 07	ACUMULADO S/,
Monto Valorizado en el Mes	3,049.80	5,382.00	5,382.00	1,614.60	5,382.00	5,382.00	1,973.40		28,165.80
Monto Por Reajuste	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZACION DE ADELANTO EN EFECTIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizacion de Adelanto en Efectivo N° 01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZACION DE ADELANTO DE MATERIALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortizacion de Adelanto de Materiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEDUCCION DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deducccion del Reajuste - Amort. Adel. Efectivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deducccion del Reajuste - Amort. Adel. Materiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. MONTO FACTURABLE (Sin IGV)	3,049.80	5,382.00	5,382.00	1,614.60	5,382.00	5,382.00	1,973.40	-	28,165.80
Monto Retenido por Fondo de Garantía	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. TOTAL ACUMULADO POR RETENCIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. MONTO LIQUIDO A APAGAR	3,049.80	5,382.00	5,382.00	1,614.60	5,382.00	5,382.00	1,973.40	-	28,165.80
IV. I.G.V.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. MONTO A FACTURAR (I + IV)	3,049.80	5,382.00	5,382.00	1,614.60	5,382.00	5,382.00	1,973.40	-	28,165.80



Firmado
digitalmente por
OLIVERA UMERES
Alfredo FAU
20116544289 soft
Fecha: 2023.04.26
16:09:55 -05'00'


 Ing. Jesus Orosco Leguia
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP: 155249

VALORIZACIÓN BRUTA N° 07 - ABRIL 2023

ORDEN DE COMPRA N° : 04500056723

SUPERVISOR DE LA OBRA : ING. JESUS OROSCO LEGUIA

DESAGREGADO DE COSTOS QUE DI ERON ORI GEN A LA PROPUESTA ECONÓMI CA																	
RENOVACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA, EN EL (LA) ALIMENTADOR DE CHUQUIBAMBILLA, EN LOS SECTORES DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC																	
A COSTO MENSUAL POR TARI FAS																	
A.1	Profesionales Asignados a la Supervisión		CONTRACTUAL			Acumulado Anterior			Valorización del Mes			Acumulado Total			Saldo a Valorizar		
	DESCRIPCION	Unidad	Costo Unitario S/. Mensual	Cant.	Subtotal S/.	Cant.	Costo S/.	(%) Avance	Cant. Total	Costo S/.	(%) Avance	Cant.	Costo S/.	(%) Avance	Cant.	Costo S/.	(%) Avance
A	Un (1) Supervisor de Obra	mes	4,200.00	6.00	25,200.00	4.87	20,440.00	81.11%	0.37	1,540.00	6.11%	5.233	21,980.00	87.22%	0.767	3,220.00	12.78%
	SUB TOTAL				25,200.00		20,440.00			1,540.00			21,980.00			3,220.00	
A.2	Gastos Generales		CONTRACTUAL			Acumulado Anterior			Valorización del Mes			Acumulado Total			Saldo a Valorizar		
	DESCRIPCION	Unidad	Costo Unitario S/. Mensual	Cant.	Subtotal S/.	Cant.	Costo S/.	(%) Avance	Cant. Total	Costo S/.	(%) Avance	Cant.	Costo S/.	(%) Avance	Cant.	Costo S/.	(%) Avance
A	Equipos de Protección Personal (incl. Zapato dieléctrico, pantalón, camisa, casaca, casco e implementación COVID-19)	mes	240.00	6.00	1,440.00	4.87	1,168.00	81.11%	0.37	88.00	6.11%	5.233	1,256.00	87.22%	0.767	184.00	12.78%
B	Otros gastos(Movilidad visita a Obra)	mes	840.00	6.00	5,040.00	4.87	4,088.00	81.11%	0.37	308.00	6.11%	5.233	4,396.00	87.22%	0.767	644.00	12.78%
C	Pólizas, seguros y otros (CTS; AFP; SCTR; Vacaciones, Gratificaciones)	mes	102.00	6.00	612.00	4.87	496.40	81.11%	0.37	37.40	6.11%	5.233	533.80	87.22%	0.767	78.20	12.78%
	SUB TOTAL				7,092.00		5,752.40			433.40			6,185.80			906.20	
B PROCESO DE LI QUI DACION																	
B.1	Profesionales Asignados		CONTRACTUAL			Acumulado Anterior			Valorización del Mes			Acumulado Total			Saldo a Valorizar		
	DESCRIPCION	Unidad	Costo Unitario S/. Global	Cant.	Subtotal S/.	Cant.	Costo S/.	(%) Avance	Cant. Total	Costo S/.	(%) Avance	Cant.	Costo S/.	(%) Avance	Cant.	Costo S/.	(%) Avance
A	Un (1) Supervisor de Obra	Global	4,500.00	1.00	4,500.00	0.00	0.0	0.00%	-	-	0.00%	-	-	0.00%	1.0	4,500.0	100.00%
	SUB TOTAL				4,500.00		-			-			-			4,500.00	
TOTAL SERVI CIO DE CONSULTORI A					36,792.00		26,192.40			1,973.40			28,165.80			8,626.20	



Firmado digitalmente por OLIVERA UMERES Alfredo FAU
20116544289 soft
Fecha: 2023.04.26
16:10:06 -05'00'



Ing. Jesus Orosco Leguia
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 155249

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

RENOVACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA, EN EL (LA) ALIMENTADOR DE CHUQUIBAMBILLA, EN LOS SECTORES DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU,
DEPARTAMENTO APURIMAC

ESTRUCTURA BASICA Y COSTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA						CRONOGRAMA DE UTILIZACIÓN DE RECURSOS										
COMPONENTES				Unidad	Cantid.	Costo Unitario S/.	Mes 1 Oct 2022 (17 Dias)	Mes 2 Nov 2022 (30 Dias)	Mes 3 Dic 2022 (30 Dias)	Mes 4 Ene 2023 (09 Dias)	Mes 5 Feb 2023 (30 Dias)	Mes 6 Mar 2023 (30 Dias)	Mes 7 Abr 2021 (11 Dias)	Mes 8 May 2023 (23 Dias)	Proceso de Liquidación	TOTAL S/.
A	COSTO MENSUAL POR TARI FAS															
	A.1	Profesionales Asignados a la Supervisión														
		Un (1) Supervisor de Obra			Mes	6.00	4,200.00	2,380.00	4,200.00	4,200.00	1,260.00	4,200.00	4,200.00	1,540.00	3,220.00	25,200.00
	A.2	Gastos Generales														
		Equipos de Protección Personal (incl. Zapato dieléctrico, pantalón, camisa, casaca, casco e implementación COVID-19)			Mes	6.00	240.00	136.00	240.00	240.00	72.00	240.00	240.00	88.00	184.00	1,440.00
		Otros gastos(Movilidad visita a Obra)			Mes	6.00	840.00	476.00	840.00	840.00	252.00	840.00	840.00	308.00	644.00	5,040.00
		Pólizas, seguros y otros (CTS; AFP; SCTR; Vacaciones, Gratificaciones)			Mes	6.00	102.00	57.80	102.00	102.00	30.60	102.00	102.00	37.40	78.20	612.00
SUB TOTAL A:							3,049.80	5,382.00	5,382.00	1,614.60	5,382.00	5,382.00	1,973.40	4,126.20	0.00	32,292.00
B	PROCESO LIQUIDACIÓN DE OBRA (Partida Global)															
	B.1	Profesionales Asignados														
		Un (1) Supervisor de Obra			Glb	1.00	4,500.00								4,500.00	4,500.00
SUB TOTAL B:							-								4,500.00	4,500.00
TOTAL SUPERVISI ON (A + B)							3,049.80	5,382.00	5,382.00	1,614.60	5,382.00	5,382.00	1,973.40	4,126.20	4,500.00	36,792.00



 Ing. Jesus Orusco Leguia
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP: 155249

ESQUEMA DEL SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA					
Requerimiento del Servicio de Consultoría en Supervisión de Obra					
OBRA:					
RENOVACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA, EN EL (LA) ALIMENTADOR DE CHUQUIBAMBILLA, EN LOS SECTORES DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC					
SERVICIO DE CONSULTORIA EN SUPERVISION DE OBRA					
	COSTO POR PERSONAL				
	PERSONAL ASIGNADO		Remuneración (S/ x Hora)	Horas Trabajadas (Promedio)	Total Honorarios (S/ x Día)
1	Ingeniero Electricista y/o Mecanico Electricista	* Revision de Replanteo e Ingeniería de Detalle * Verificación de Valorizaciones * Emisión de Informes Mensuales. * Realización de Cálculos Justificativos Requeridos por la Entidad para * Absolución de Consultas del Contratista. * Emisión de informe y análisis de Ampliaciones de Plazo. * Emisión de Informe y Análisis de Prestaciones Adicionales de obra. * Supervisión Física y Económica de la Obra	17.50	8	140
	Remuneración =				140.00
I.	COSTO POR ACTIVIDADES MENSUAL:				
	PERSONAL ASIGNADO	Profesional Asignado	Costo Unitario (S/)	Nº de Días	Total Honorarios (S/)
1	Ingeniero Electricista y/o Mecanico Electricista	1	140.00	30	4,200.00
	Sub Total Remuneración =				4,200.00
II	COSTO POR LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA (Incl. Metrados Conforme a Obra):	Profesional Asignado	Costo Unitario (S/)	Total Honorarios (S/)	
1	Ingeniero SUPERVISOR	1	4,500.00	4,500.00	
III	GASTOS GENERALES	COSTO x DIA (S/)	Cantidad	Nº de Días	Total (S/)
1	Equipos de Protección Personal (incl. Zapato dieléctrico, pantalón, camisa, casaca, casco e implementación COVID-19)	8.00	1	30	240.00
2	Movilidad visita a la Obra	105.00	1	8	840.00
5	Pólizas, seguros y otros (CTS; AFP; SCTR; Vacaciones, Gratificaciones)	3.40	1	30	102.00
					1,182.00
	COSTO TOTAL DEL SERVICIO				5,382.00
I+III	TOTAL SERVICIO POR 06 MESES				32,292.00
I+II+III	COSTO TOTAL DEL SERVICIO				36,792.00



Ing. Jesus Orusco Leguia
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 155249



Jesús Orosco Leguía
Ingeniero Electricista
CIP:155249
Telf. Cel.: 943420086

INFORME DE SUPERVISION



Jesús Orosco Leguía
Ingeniero Electricista
CIP:155249
Telf. Cel.: 943420086

CARTA N° 019-2023/SUP-ELSE-A/JOL.

PARA : ING. ALFREDO OLIVERA UMERES
JEFE DE OBRAS - ELECTRO SUR ESTE S.A.A. APURIMAC

DE : ING. JESUS OROSCO LEGUIA
SUPERVISOR DE OBRA

ASUNTO : REMITE INFORME AVANCE DE OBRA – MES ABRIL 2023

REFERENCIA : 1. OBRA: RENOVACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA, EN EL (LA) ALIMENTADOR DE CHUQUIBAMBILLA, EN LOS SECTORES DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC.
2. Contrato N°57-2022.

FECHA : 26 DE ABRIL DEL 2023

De mi mayor consideración:

Mediante la presente me dirijo a usted, para expresarles un cordial saludo y a la vez remitir **EL INFORME DE AVANZE DE OBRA - MES ABRIL 2023** de la ejecución de obra “**OBRA: RENOVACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA, EN EL (LA) ALIMENTADOR DE CHUQUIBAMBILLA, EN LOS SECTORES DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC.** A cargo del contratista P y G PROYECTOS Y CONTRATOS SRL, Sustentado en los siguientes Ítems.

I. DATOS GENERALES DE OBRA

PROPIETARIO	:	ELECTRO SUR ESTE S.A.A. (ELSE)
CONTRATISTA	:	P y G PROYECTOS Y CONTRATOS S.R.L.
SUPERVISOR	:	ING. JESUS OROSCO LEGUIA
RESIDENTE	:	ING. MARIO J. ALVAREZ CHACON
PROCESO DE SELECCION	:	AS - N° 006-2022-ELSE
CONTRATO	:	Nro. 057 - 2022
MODALIDAD DE EJECUCION	:	A PRECIOS UNITARIOS
PRESUPUESTO CONTRATADO	:	S/. 1, 369,905.75. INCL. IGV.
ADICIONAL 01	:	DECLARADO IMPROCEDENTE MEDIANTE RESOLUCION N°G-014-2023, 27/01/2023.
ADICIONAL 02	:	DECLARADO IMPROCEDENTE MEDIANTE RESOLUCION N°G-051-2023, 15/03/2023.
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	240 DIAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO	:	10 DE AGOSTO DEL 2022
FECHA DE TÉRMINO	:	06 DE ABRIL DEL 2023.



Ing. Jesús Orosco Leguía
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 155249



II. RESPONSABLES DE OBRA

2.1. POR LA ENTIDAD

- Gerente de Proyectos : Ing. Ronal Gamarra Santos
- Jefe de Obras Apurimac : Ing. Alfredo Umeres Olivera
- Supervisor de Obra : Ing. Jesus Orosco Leguia

2.2. POR EL CONTRATISTA

- Representante Legal : Ing. Noemi Trujillano Arriola
- Residente de Obra : Ing. Mario J. Alvarez Chacon
- Asistente de Obra : Ing. Luis Paul Paz Lagos
- Supervisor Seguridad : Ing. Idelfonso Maquera Maquera.
- Personal Salud : Carmen Nataly Tenorio Valenzuela
- Arqueologo : Lic. Lisbeth Ccana Ccana
- Personal tecnico y Auxiliares
- Movilidad, Equipo y Herramientas.

III. DESARROLLO DE OBRA.

3.1. PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

- ✓ Durante el mes de abril 2023, se completó con las actividades de instalación de subestación, tablero de distribución y conexión a la red existente de la red primaria en el sector Paccayura.
- ✓ Durante el mes también se ha completado las partidas correspondientes a desmontaje de materiales como postes de concreto, postes madera, postes fierro, armados, retenidas, luminarias y conductores y la entrega correspondiente a la empresa concesionaria electro sur este s.a.a.
- ✓ Durante el mes también se ha realizado las partidas correspondientes a desmontaje de armados, retenidas, luminarias y conductores. Los cuales se ha llevado previa trasferencia de acometidas a la red nueva.
- ✓ Instalación de Tubos bastón para acometidas domiciliarias.
- ✓ Codificación de estructuras.
- ✓ Visitas a obra y control de materiales.
- ✓ Llenado y control de Cuaderno de Obra digital.

Ing. Jesus Orosco Leguia
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 155249

IV. RESUMEN DE VALORIZACION APROBADA

A la fecha el contratista no ha presentado su valorización correspondiente al mes de abril 2023, por lo que, quedando a pocos días para culminar el mes se entiende que se valorizara en la liquidación de Obra.

La última valorización presentada al mes de marzo 2023 es como sigue:



RESUMEN DE VALORIZACIONES PRESENTADAS

N°	MES	DESCRIPCION	MONTO EN SOLES
1	AGOSTO 2022	VALORIZACION N° 01	21,535.66
2	SETIEBRE 2022	VALORIZACION N° 02	533,859.45
3	OCTUBRE 2022	VALORIZACION N° 03	41,210.84
4	NOVIEMBRE 2022	VALORIZACION N° 04	77,660.43
5	DICIEMBRE 2022	VALORIZACION N° 05	425,854.98
6	ENERO 2023	VALORIZACION N° 06	41,190.00
8	FEBRERO 2023	VALORIZACION N° 07	73,036.65
9	MARZO 2023	VALORIZACION N° 08	130,310.26
10	ABRIL 2023	--	
ACUMULADO			1,344,658.27

VALORIZACION DE OBRA N° 08							
OBRA : RENOVACION DE RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA; EN EL(LA) ALIMENTADOR DE CHUQUIBAMBILLA, EN LOS SECTORES DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA GRAU, DEPARTAMENTO APURIMAC							
CONTRATISTA : P Y G PROYECTOS S.R.L.							
FECHA VALORIZACION : Agosto-2022							
PRESUPUESTO CONTRA:		1,369,905.74	(con I.G.V.)	1,160,937.07	(sin I.G.V.)		
ADELANTO DIRECTO		-	(con I.G.V.)	-	(sin I.G.V.)		
ADELANTO MATERIALES		-	(con I.G.V.)	-	(sin I.G.V.)		
% AVANCE DE OBRA		94.80%					
	DESCRIPCION	PRESUPUESTO DE CALCULO (SIN IGV)	VALORIZACION			% AVANCE ACUMULADO	SALDO POR VALORIZAR
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO		
A:	VALORIZACION CONTRACTUAL						
	PRESUPUESTO CONTRATADO	1,160,937.07	995,651.94	104,874.09	1,100,526.03	94.80%	60,411.04
	TOTAL (A)	1,160,937.07	995,651.94	104,874.09	1,100,526.03	94.80%	60,411.04
	AVANCE FISICO DE OBRA		85.76%	9.03%	94.80%	94.80%	5.20%
B:	REAJUSTES						
	REINGRESOS			-	-		
	REAJUSTE POLINOMICA		12,422.39	5,558.33	17,980.72		
	TOTAL (B)		12,422.39	5,558.33	17,980.72		
	VALORIZACION BRUTA (VB=A+B)		1,008,074.33	110,432.42	1,118,506.75		
	VALORIZACION NETA (VN=VB-C)		1,008,074.33	110,432.42	1,118,506.75		
C:	MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA						
	EN EFECTIVO (VN-D)		1,008,074.33	110,432.42	1,118,506.75		
	EN I.G.V (18%*VN)		181,453.38	19,877.84	201,331.22		
	TOTAL (E)		1,189,527.71	130,310.26	1,319,837.97		
TOTAL COMPROMISO A SOLICITAR				130,310.26		9.51%	

V. CONTROL ECONOMICO Y AVANCE DE OBRA

El avance físico programado **acumulado al mes de marzo es de 99.82%** y el avance físico ejecutado acumulado al mes de marzo es de **94.80%**.




Ing. Jesús Orosco Leguía
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 155249



Jesús Orosco Leguía
Ingeniero Electricista
CIP:155249
Telf. Cel.: 943420086

CURVA "S" DE AVANCE FISICO PROGRAMADO Y EJECUTADO

PERIODO	AVANCE PROGRAMADO SOLES		PORCENTAJE		AVANCE EJECUTADO SOLES		PORCENTAJE		AVANCE RELATIVO (%)
MES	MENSUAL	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	
ago-22	17,481.38	17,481.38	1.51%	1.83%	17,481.38	17,481.38	1.51%	1.51%	82.24%
sep-22	443,552.22	461,033.60	38.21%	4.03%	443,552.22	461,033.60	38.21%	39.71%	985.06%
oct-22	33,452.53	494,486.13	2.88%	29.06%	33,452.53	494,486.13	2.88%	42.59%	146.56%
nov-22	62,323.79	556,809.92	5.37%	65.11%	62,323.79	556,809.92	5.37%	47.96%	73.67%
dic-22	34,880.19	591,690.11	3.00%	81.78%	346,015.39	902,825.30	29.80%	77.77%	152.58%
ene-23	372,960.34	964,650.45	32.13%	91.27%	33,596.52	936,421.82	2.89%	80.66%	100.72%
feb-23	91,491.07	1,056,141.52	7.88%	98.09%	59,230.11	995,651.93	5.10%	85.76%	94.27%
mar-23	58,639.30	1,114,780.82	5.05%	99.82%	104,874.09	1,100,526.03	9.03%	94.80%	98.72%
abr-23	46,156.23	1,160,937.05	3.98%	100.00%					
	1,160,937.07	1,160,937.07	100%	100%	1,100,526.03	1,100,526.03	94.80%	94.80%	

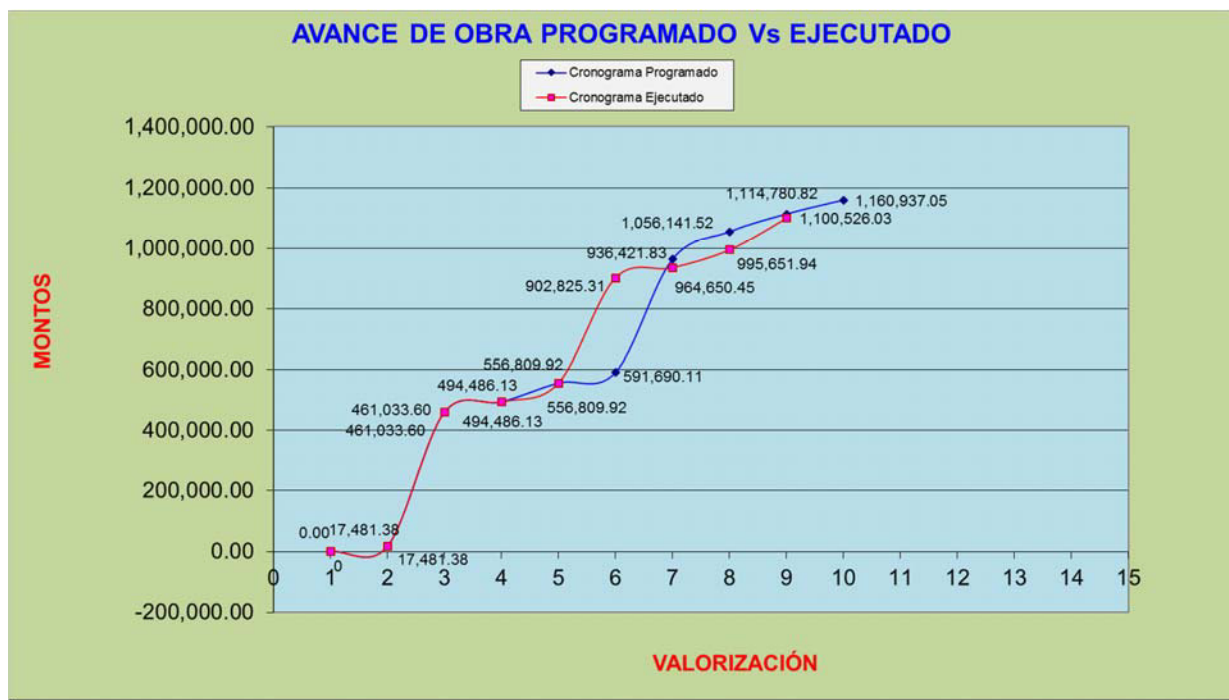

VI. PROBLEMAS EN EL DESARROLLO DE OBRA

En el presente mes abril 2023, existió la oposición de las personas y directivos de algunos sectores para desmontaje de postes y transporte de los mismos al almacén de Electro Sur Este, los cuales se ha superado mediante coordinaciones.

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ A la fecha el contratista no presento su valorización del mes de abril 2023.
- ✓ El Avance físico programado acumulado al mes de marzo es de 99.82% y el avance físico



Ing. Jesús Orosco Leguía
 SUPERVISOR DE OBRA
 CIP: 155249



ejecutado acumulado al mes de marzo es de 94.80%.

- ✓ No hay penalidad por aplicar al contratista en el periodo correspondiente del mes de abril del 2023.
- ✓ La obra la culminado en fecha 06 de abril del 2023 y verificado por la supervisión en fecha 11 de abril del 2023, encontrándose conforme.

Es todo cuanto tengo que informar para los fines que estime conveniente

Se adjunta.

- 01 Expediente de valorización original +01 Copia.

Sin otro particular por el momento me suscribo de usted.



Ing. Jesús Orosco Leguía
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 155249



ALBUM FOTOGRAFICO



Charla 5min, y cumplimiento plan covid.




Ing. Jesús Orosco Leguía
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 155249



Jesús Orosco Leguía
Ingeniero Electricista
CIP:155249
Telf. Cel.: 943420086

Transporte de postes, materiales de ferreteria y conductores desmontados al almacen de Obra.



Entrega de materiales desmontados en alancen de Electro sur Este -Abancay.


Ing. Jesús Orosco Leguía
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 155249



Entrega de conductores desmontados en alancen de Electro sur Este -Abancay. .

Dirección: Apv Paraiso De Fatima R-7
Correo: j_orsco@outlook.com



Entrega de Pastorales y Luminarias desmontados en alancen de Electro sur Este -Abancay.




Ing. Jesús Orosco Leguía
SUPERVISOR DE OBRA
CIP: 155249

Entrega de Pastorales y Luminarias desmontados en alancen de Electro sur Este -Abancay.
